FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	**OBSERVACIONES CODESA**

CÓDIGO	COMPROMISO	OBSERVACIÓN
	Personal de la Planta de Generación Eléctrica, realizando trabajo de izaje (996457 N/ 533868 E)	En la Planta de Generación Eléctrica, se encontró al personal realizando trabajo de izaje de carga, sin cuerda guía y un rigging responsable de la maniobra (ver imagen x x).

CIERRE

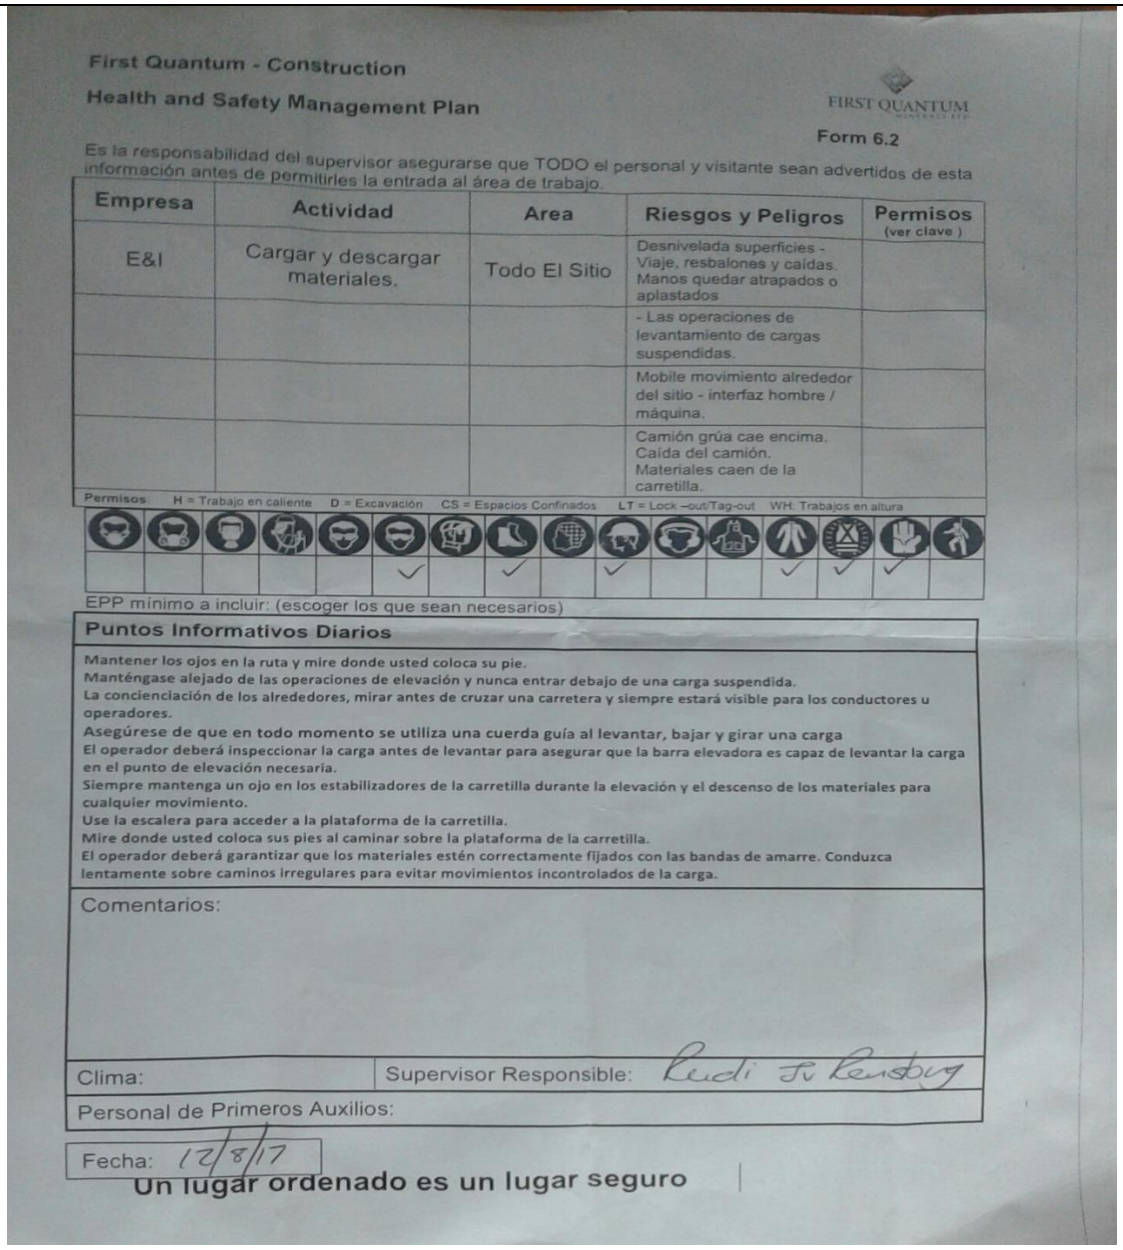

First Quantum - Construction

Health and Safety Management Plan

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Form 6.2

Es la responsabilidad del supervisor asegurarse que TODO el personal y visitante sean advertidos de esta información antes de permitirles la entrada al área de trabajo.

Empresa	Actividad	Area	Riesgos y Peligros	Permisos (ver clave)
E&I	Cargar y descargar materiales.	Todo El Sitio	Desnivelada superficies - Viaje, resbalones y caídas. Manos quedar atrapados o aplastados	
			- Las operaciones de levantamiento de cargas suspendidas.	
			Mobile movimiento alrededor del sitio - interfaz hombre / máquina.	
			Camión grúa cae encima. Caída del camión. Materiales caen de la carretilla.	

Permisos: H = Trabajo en caliente D = Excavación CS = Espacios Confinados LT = Lock –out/Tag-out WH: Trabajos en altura

EPP mínimo a incluir: (escoger los que sean necesarios)

Puntos Informativos Diarios

Mantener los ojos en la ruta y mire donde usted coloca su pie.
Manténgase alejado de las operaciones de elevación y nunca entrar debajo de una carga suspendida.
La concienciación de los alrededores, mirar antes de cruzar una carretera y siempre estará visible para los conductores u operadores.
Asegúrese de que en todo momento se utiliza una cuerda guía al levantar, bajar y girar una carga
El operador deberá inspeccionar la carga antes de levantar para asegurar que la barra elevadora es capaz de levantar la carga en el punto de elevación necesaria.
Siempre mantenga un ojo en los estabilizadores de la carretilla durante la elevación y el descenso de los materiales para cualquier movimiento.
Use la escalera para acceder a la plataforma de la carretilla.
Mire donde usted coloca sus pies al caminar sobre la plataforma de la carretilla.
El operador deberá garantizar que los materiales estén correctamente fijados con las bandas de amarre. Conduzca lentamente sobre caminos irregulares para evitar movimientos incontrolados de la carga.

Comentarios:

Clima: Supervisor Responsible: Rudi Jr Lensburg

Personal de Primeros Auxilios:

Fecha: 12/8/17

Un lugar ordenado es un lugar seguro

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	**OBSERVACIONES CODESA**

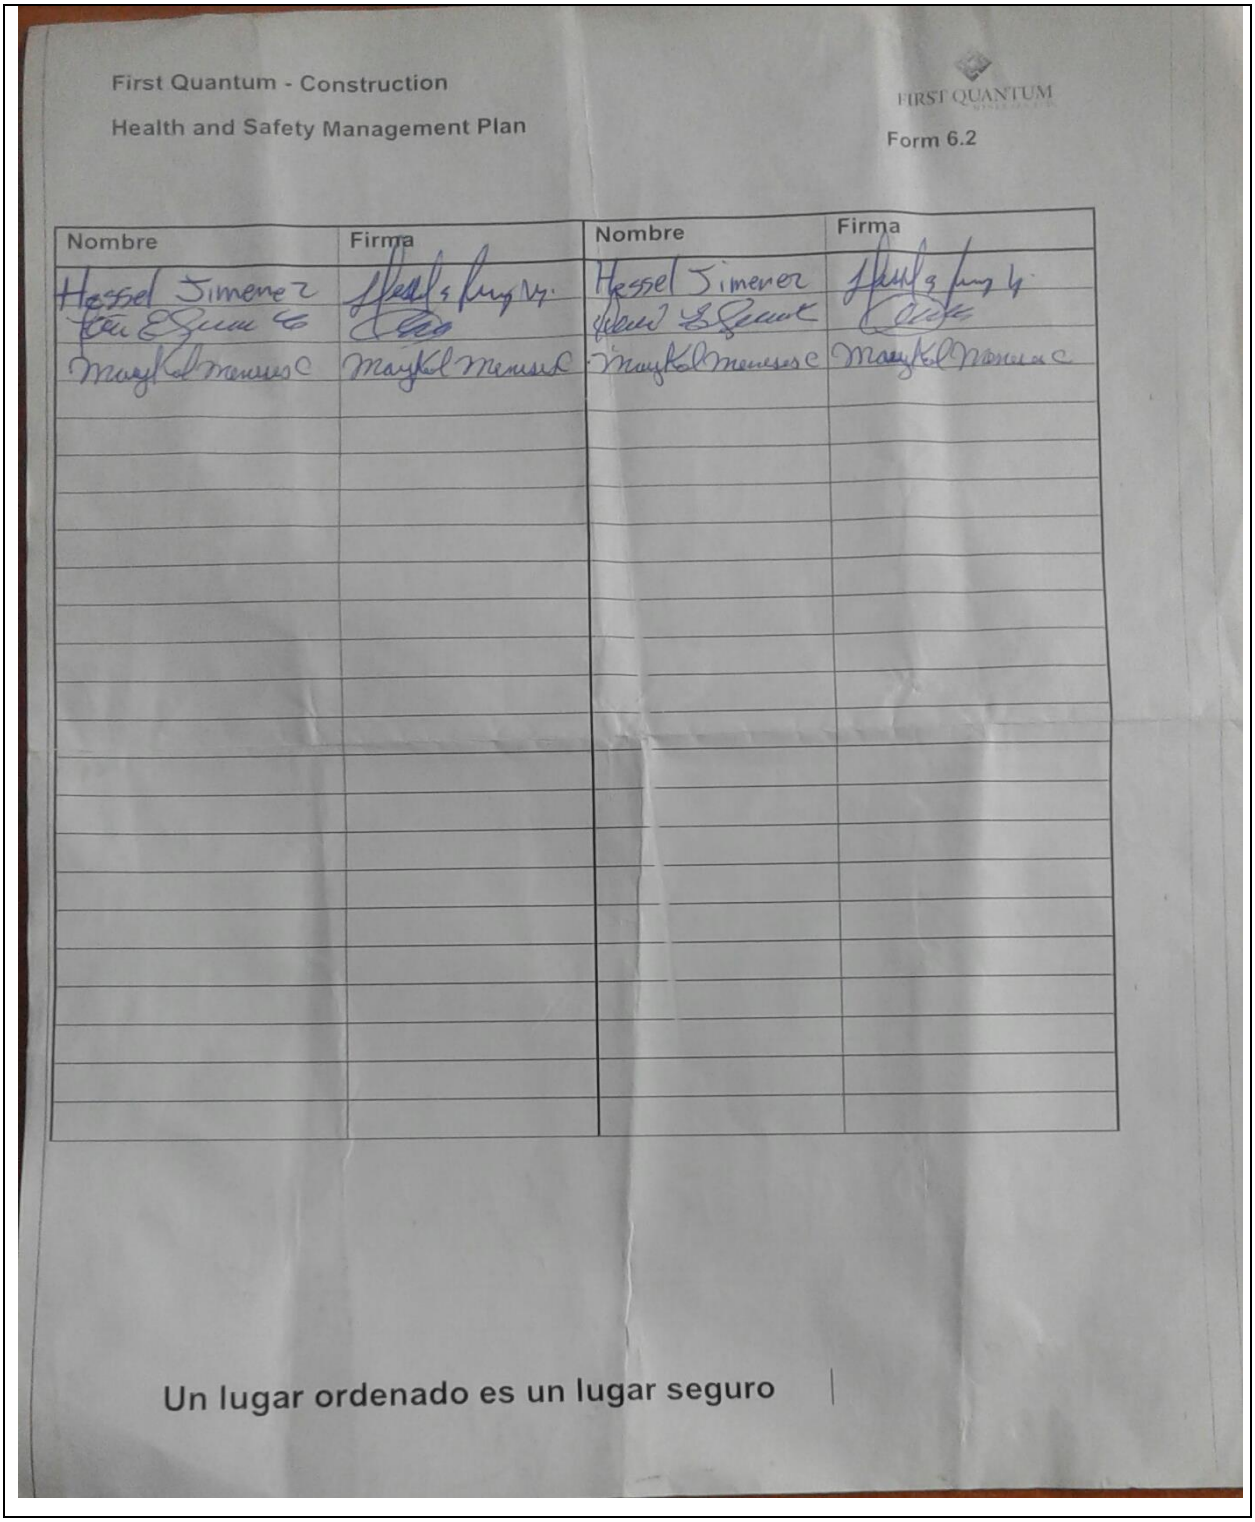

First Quantum - Construction

Health and Safety Management Plan

FIRST QUANTUM

Form 6.2

Nombre	Firma	Nombre	Firma
Hassel Jimenez		Hassel Jimenez	

Un lugar ordenado es un lugar seguro
